

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE UBIRATA-PR

ENVELOPE N.º 02 — PROPOSTA DE PREÇOS


CONCORRÊNCIA N. 008/2022

Abertura do Envelope: 08H30MIN DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023.

ALF ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

CNPJ 34.762.581/0001-10

OBJETO: MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO EM VIAS CENTRAIS, COM
RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 202218760003.

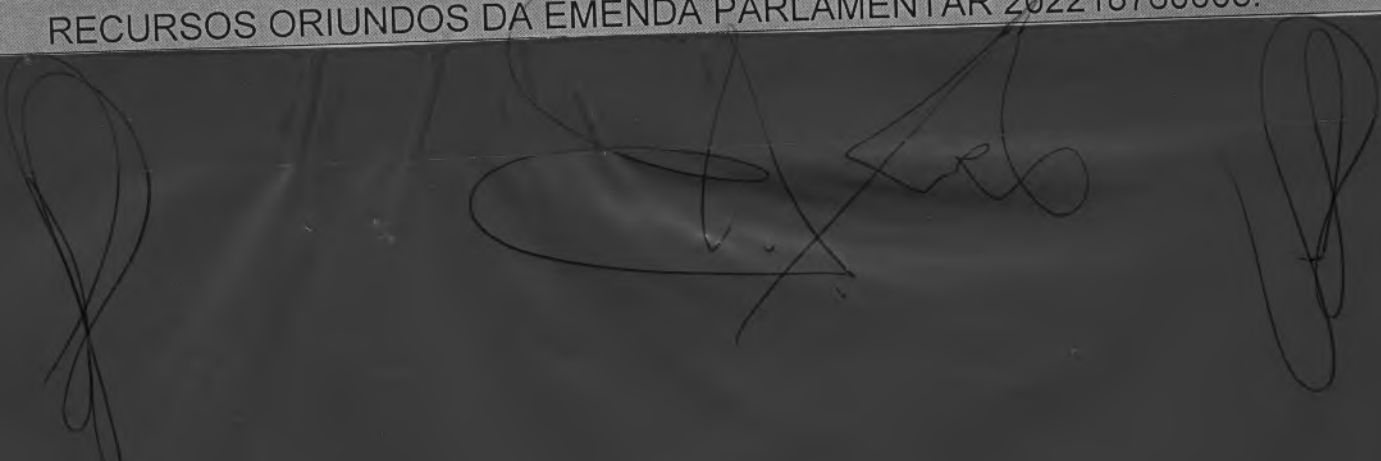





ENGENHARIA

ANEXO VIII
PROPOSTA DE PREÇOS

Licitante: ALF ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA		CONCORRÊNCIA N.º 008/2022
CNPJ: 34.762.581/0001-10	Insc. Estadual:	
Endereço: RUA SHIBAZABURO KATAZATO, 285		DATA: 26/01/2023
Cidade: MARINGÁ	Estado: PARANÁ	ENCERRAMENTO: 26/01/2023
Telefone: (44) 9.9113-5961	e-mail: luiz@voltdobrasil.com.br	Horário: 08h30

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa ao MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO EM VIAS CENTRAIS, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 202218760003, objeto da Concorrência em epígrafe.

1. O valor para execução do objeto é de R\$- (496.099,81) – QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS.

2. O prazo de execução é de dezesseis meses, contados do recebimento da Ordem de Serviços.

3. O prazo de validade da proposta de preços é de sessenta dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.

4. Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o (a) Senhor (a) LUIZ HENRIQUE DE ASSIS FAGUNDES, CPF 009.646.349-02, RG 8.971.722-1, domiciliado a rua RUBENS SEBASTIÃO MARIN 1076, MARINGÁ-PR.

5. Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representá-la durante a vigência do mesmo, será o (a) Senhor (a) LUIZ HENRIQUE DE ASSIS FAGUNDES, CPF 009.646.349-02, RG 8.971.722-1, domiciliado a rua RUBENS SEBASTIÃO MARIN 1076, MARINGÁ-PR.

**6. Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo Banco ITAU (341)
Agência 3739
Conta 99673-8**

7. Complementam a presente proposta os seguintes documentos:

A. Planilhas Orçamentárias;

B. Cronogramas Físico-Financeiros e de Execução;

MARINGÁ, 16 de JANEIRO de 2023.

LUIZ HENRIQUE DE ASSIS
FAGUNDES:00964634902

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE DE ASSIS
FAGUNDES:00964634902
Dados: 2023.01.16 12:16:34
-03'00'

Assinatura do representante legal
LUIZ HENRIQUE DE ASSIS
FAGUNDES

R. G. n.º 8.971.722-1 SSP/PR e CPF n.º 009.646.349-02



Planilha Orcamentaria
MICRO REVESTIMENTO EM VIAS CENTRAIS
AREA TOTAL 27.120,29 M²
EMPRESA: ALF ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

VELOIT
E N G E N H E I R I A

Base
DER-PR 08/2022 (SEM DESONERACAO)



Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor C/ BDI	Total
1			MICRO REVESTIMENTO EM VIAS CENTRAIS						R\$ 496.099,81
			MICRO REVESTIMENTO ESP-8MM					BDI 28,92%	R\$ 289.534,33
1.1	DER	562560	Microrrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão		m²	19808,53	R\$ 3,60	R\$ 4,94	R\$ 91.538,41
1.2			LIGANTES BETUMINOSOS					BDI 21,47%	
1.2.1	DER	589180	Fornecimento de emulsão RC-1C-E com polímero		t	27,73	R\$ 5.866,23	R\$ 7.125,71	R\$ 197.586,93
2			MICRO REVESTIMENTO ESP-16MM					BDI 28,92%	R\$ 206.565,47
2.1	DER	562620	Microrrevest.asf.a frio e= 16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão			7310,76	7,00	R\$ 9,02	R\$ 65.975,22
2.2			LIGANTES BETUMINOSOS					BDI 21,47%	
2.2.1	DER	589180	Fornecimento de emulsão RC-1C-E com polímero		t	18,73	R\$ 5.866,23	R\$ 7.125,71	R\$ 140.590,25

OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCU PLACA DE OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ESTÃO INCLUIDOS NO BDI.

Total Geral

R\$ 496.099,81

Data: 16/01/23

LUIZ HENRIQUE DE ASSIS FAGUNDES
SÓCIO-ADMINISTRADOR E ENGENHEIRO CIVIL
CREA 100782-D/PR

Data: 16/01/23

LUIZ HENRIQUE DE ASSIS
Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE DE ASSIS
FAGUNDES:00964634902
Dados: 2023.01.16 12:14:55
-03'00"



VOLT

OBJETO: Microrevestimento Asfáltico conforme discriminado no objeto
EMPRESA: ALF ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO (%)																													
Item	GRUPO DE SERVIÇO	FINANCEIRO			FÍSICO			30						60						90						Acumulado			
					Valor do Item	Quantidade	%	m²	R\$	%	m²	R\$	%	m²	R\$	%	m²	R\$	%	m²	R\$								
1	MICRO REVESTIMENTO ESP.8MM				289.534,33	19.809,53	34,00%	6.735,24	98.441,67	33,00%	6.537,14	95.546,33	33,00%	6.537,14	95.546,33	100,00%	19.809,53	289.534,33											
2	MICRO REVESTIMENTO ESP.16MM				206.565,47	7.310,76	34,00%	2.485,66	70.232,26	33,00%	2.412,55	68.166,61	33,00%	2.412,55	68.166,61	100,00%	7.310,76	206.565,47											
					496.099,81	27.120,29	34,00%	9.220,90	168.673,93	33,00%	8.949,70	163.712,94	33,00%	8.949,70	163.712,94	100,00%	27.120,29	496.099,81											

Data: 16/01/23

por LUIZ HENRIQUE DE ASSIS

Dados: 2023.01.23

10:54:39 -03'00'

Q



ENGENHARIA
EMPRESA: ALF ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

BDI ESTIMATIVO DER/PR – SEM DESONERAÇÃO			INTERVALOS ADMISSÍVEIS		
			1º QUARTIL	2º QUARTIL	3º QUARTIL
ADIMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01	3,8	4,01	4,67
ADIMINISTRAÇÃO LOCAL	AL (*)	6,99	1,98	6,99	10,68
RISCOS	R (*)	0,56	0,5	0,56	0,97
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,4	0,32	0,4	0,74
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,11	1,02	1,11	1,21
LUCRO	L (*)	7,3	6,64	7,3	8,69
TRIBUTOS (T)	ISS	3,82	Alíquota SIMPLES NACIONAL JAN/2023		
	PIS	1,58			
	COFINS	0,38			
SUB-TOTAL		5,78			
BDI	%	28,92			
BDI REDUZIDO	%	21,47			
PERCENTUAL DE ISS = 3% X 50% = 1,50% (**)					
BDI = (((1+(AC+AL+R+SG)/100)X(1+DF/100)X(1+L/100))/(1-T/100))-1)X100					
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS – EM CONFORMIDADE COM O ÁCORDÃO 2622/13-P TCU					
(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIOS ABRANGIDO(S) PELA OBRA					

LUIZ HENRIQUE DE ASSIS FAGUNDES
SÓCIO-ADMINISTRADOR E ENGENHEIRO CIVIL
CREA 100782-D/PR

Data: 16/01/23

LUIZ HENRIQUE DE
ASSIS
FAGUNDES:009646349
02

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE DE ASSIS
FAGUNDES:00964634902
Dados: 2023.01.16 11:51:21
-03'00'
